

ResearchCruiseApp

Retrospektywa sprintu

Wersja dokumentu	1.0.0
Data utworzenia obecnej wersji	2026-05-17
Data utworzenia dokumentu	2026-05-17

Wojciech Siwiec	s197815
Paweł Narwojsz	s197977
Filip Pudlak	s198157
Bartosz Łyskanowski	s198051

1. O projekcie i produkcji

- **Projekt:** Opracowanie systemu do zarządzania rejsami statku RV Oceanograf dla Biura Armatora Uniwersytetu Gdańskiego.
- **Produkt:** Aplikacja internetowa wspierająca organizację i obsługę rejsów statku należącego do Biura Armatora Uniwersytetu Gdańskiego. Narzędzie jest przeznaczone zarówno dla pracowników Biura Armatora, jak i kadry uczelni planującej rejsy badawcze. Umożliwia ono m.in. wypełnianie niezbędnych formularzy oraz koordynację harmonogramu rejsów.

2. Wybrana technika retrospektywy


Wybraną techniką retrospektywy była retrospektywa typu 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for). Metoda ta polega na zebraniu opinii naszego zespołu w czterech obszarach:

- Liked – co podobało się podczas sprintu,
- Learned – czego zespół nauczył się w trakcie pracy,
- Lacked – czego zabrakło podczas realizacji sprintu,
- Longed for – czego zespół oczekiwał lub co chciałby usprawnić w kolejnych sprintach.

Technika została przeprowadzona w formie spotkania zdalnego na tablicy z karteczkami. Każdy z nas mógł również się swobodnie wypowiedzieć na dowolny temat dotyczący projektu. Wybraliśmy tę metodę ze względu na możliwość użycia AI oraz prostotę i intuicyjność metody.

Etapy retrospektywy:

- Wstęp : Zwierze sprintu - Przyrównywaliśmy nasze działania w trakcie sprintu, a następnie AI generowało zwierzę na podstawie naszych opisów. Pomogło to w rozluźnieniu atmosfery.
- Karteczki 4L - Każdy miał czas na wpisanie od siebie karteczek, które następnie wspólnie omówiliśmy łącznie z powiązanymi tematami.
- Podsumowanie i przegląd AI. - Ostatnie zdania od każdego z zespołu oraz analiza wygenerowanych przez AI treści.
- Czas trwania: ok. 40 min
- Link do wirtualnej tablicy retrospektywy https://miro.com/app/board/uXjVHSt7YvQ=
- Źródło opisu: <https://www.teamretro.com/retrospectives/4ls-retrospective/>

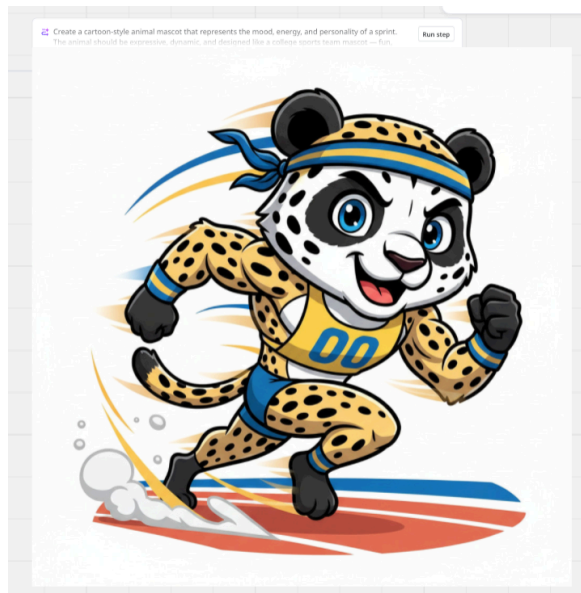

3. Przebieg i wyniki retrospektywy

Retrospektywa odbyła się zdalnie po zakończeniu sprintu w piątek 15.05.2026, trwała około 40 minut. Udział w niej brał cały zespół deweloperski (4 osoby). Moderatorem retrospektywy został Wojciech Siwiec, a notującym Bartosz Łyskanowski. Spotkanie odbywało się na kanale głosowym Discord, a rolę wirtualnej tablicy pełnił serwis Miro z szablonem do typu retrospektywy 4L. Każdy uczestnik miał kilka minut na dodanie karteczek w poszczególnych etapach. Gdy wszyscy dodali na tablicy karteczki, zaczęliśmy omówienie ich.

Główne wnioski z retrospektywy:

Ulubione aspekty

- Spotkania z promotorem i zainteresowanymi projektem.
- Dobra komunikacja w zespole, szczególnie podczas spotkań.
- Efektywne rozwiązywanie problemów technicznych na bieżąco.

Nowości / pogłębione tematy

- Znalezienie i omówienie narzędzia do obserwowalności aplikacji.
- Znalezienie nowych błędów związanych z uprawnieniami użytkowników.

Problemy w projekcie

- Znikający kontakt z klientem.
- Szybsze / częstsze code review.
- Tworzenie dokumentacji do pracy inżynierskiej.

Pragnienia w projekcie

- Zwiększenie liczby spotkań z klientem.
- Dokładniejsze omawianie poszczególnych zadań.
- Wydobywanie bardziej precyzyjnych wymagań do implementacji.
- Dostarczona przez klienta dokumentacja opisująca poszczególne role i uprawnienia.

Przykładowa analiza AI

I am providing you with the raw output of a "4Ls Retrospective" workshop. The content is organized into four frames:Run step

	Action / Next Step	Why It's Important	Success Criteria	Owner	Due Date	Priority
1	Establish regular client communication cadence (weekly sync meetings)	Team identified weak client contact in last sprint as a blocker and explicitly longed for more client engagement. This directly addresses the most critical gap identified in the retrospective.	Weekly client meetings scheduled and attended with >80% attendance rate; client feedback incorporated into sprint planning; team reports improved clarity on requirements	TBD		High
2	Implement and configure hyperDX observability tool	Team learned about and selected hyperDX as the observability solution. Acting on this decision will improve system monitoring and debugging capabilities.	HyperDX fully deployed to production; team trained on basic usage; at least 3 key services instrumented and monitored; observability dashboards created	TBD		High
3	Maintain and strengthen internal team communication practices	Team highlighted good internal communication as a strength. Preserving this foundation is essential for continued collaboration and morale.	Team communication satisfaction remains high in next retro; no communication-related blockers reported; continuation of current communication channels and practices	TBD		Medium
4	Continue stakeholder engagement (follow-up with Mr. Goluch)	Positive conversation with Mr. Goluch was highlighted as a success. Maintaining this relationship ensures alignment and support.	Follow-up meeting scheduled with Mr. Goluch; stakeholder feedback gathered and documented; alignment on project direction confirmed	TBD		Medium
5	Preserve team culture and morale initiatives	Strong memes and team culture were celebrated. Maintaining positive team dynamics supports productivity and retention.	Team morale remains high in next retro; team bonding activities continue; positive team culture indicators maintained	TBD		Low

4. Zadania do wykonania - action items

- Ustalenie regularnych spotkań z klientem:**

Zespół uznał, że kluczowe jest częstsze kontaktowanie się z klientem w celu doprecyzowania wymagań. Ustalono, że spotkania powinny odbywać się chociaż raz w miesiącu. Wybrano tę opcję, aby zminimalizować niejasności i zwiększyć liczbę szczegółowo opisanych wymagań.
- Wprowadzenie narzędzia do obserowalności:**

Zdecydowano o wdrożeniu narzędzia HyperDX, które pomoże w analizie działania systemu poprzez zbieranie i korelowanie logów, oraz metryk z aplikacji. Narzędzie będzie wykorzystywane do identyfikowania trudnych do odtworzenia błędów, które pojawiają się tylko w środowisku produkcyjnym lub w specyficznych warunkach użytkowników. Dzięki temu będziemy mogli sprawniej diagnozować problemy, skrócić czas reakcji na incydenty oraz zwiększyć stabilność systemu.
- Zadania zasugerowane przez podsumowanie AI**

5. Wnioski

Zastosowana technika retrospektywy 4L okazała się prostą i skuteczną metodą podsumowania sprintu. Podział na cztery obszary pozwolił uporządkować opinie zespołu oraz ułatwił identyfikację zarówno pozytywnych aspektów pracy, jak i problemów wymagających poprawy. Dzięki temu każdy uczestnik mógł w łatwy sposób przedstawić swoje spostrzeżenia. Ćwiczenie rozgrzewkowe, jak i AI pomogło w skupieniu się i bardziej zachęciło do udziału w retrospektywie przez zabawny aspekt. Metoda okazała się bardzo przyjemna i prosta w przeprowadzeniu oraz luźnej atmosferze.
